

PORTFÓLIO DE PROJETOS

2020 - 1º Semestre



— INSTITUTO FEDERAL —
Rondônia

Portfólio do IFRO

EM EXECUÇÃO

1. **Gestão Documental do IFRO.**
2. **Fortalecimento da Gestão - Revisão do PDI 2018-2022**
3. Fortalecimento dos NAPNEs
4. **IFRO para Todos**
5. **IFRO sem Fronteiras**
6. **Modernização da Gestão-Política de Gestão de Riscos**
7. **Modernização da Gestão Implantação do Escritório de Gerenciamento de Projetos, Processos e Riscos**
8. **Planejar Para Crescer**
9. **Política de Comunicação**
10. **Programa Saúde e Segurança do Servidor**

NÃO INICIADO

1. Gestão por Competência
2. Fortalecimento da Identidade Institucional
3. Regulamentação do Observatório do IFRO

FINALIZADO

1. Institucionalização da EaD
2. Orçamento Transparente
3. IFRO na Comunidade
4. Integrar
5. Fortalecimento das Pesquisas de Apoio a Gestão
6. Fortalecimento da Gestão – Plano Anual de Trabalho/PAT
7. Modernização da Gestão - Desenvolvimento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação do IFRO
8. Programa de Qualificação, Capacitação e Valorização do Servidor

Análise

- ❖ Projetos sem atraso
 - ✓ Gestão Documental do IFRO

- ❖ Até 10% de atraso = Nível Pequeno – Acionar o líder do Projeto


- ❖ De 11% a 30% de atraso = Nível Moderado – Acionar o responsável pela área (Pró-Reitoria ou Diretoria Sistêmica)
 - ✓ Fortalecimento da Gestão Revisão do PDI 2018-2022
 - ✓ IFRO para Todos
 - ✓ Modernização da Gestão Implantação do EGPPR
 - ✓ Modernização da Gestão Política de Gestão de Riscos
 - ✓ Planejar Para Crescer

- ❖ De 31% a 60% de atraso = Nível Alto – Acionar CODIR acatando a sugestão do responsável pela área (Pró-Reitoria ou Diretoria Sistêmica)
 - ✓ Programa de Saúde e Segurança do Servidor


- ❖ De 61% a 100% de atraso = Nível Crítico – Acionar ao Colégio de Dirigentes – CODIR, sem acatar a decisão da área.
 - ✓ Política de Comunicação

- ❖ Projetos que enceram no período
 - ✓ IFRO sem Fronteiras
 - ✓ Fortalecimento dos NAPNEs

Percentual de Execução

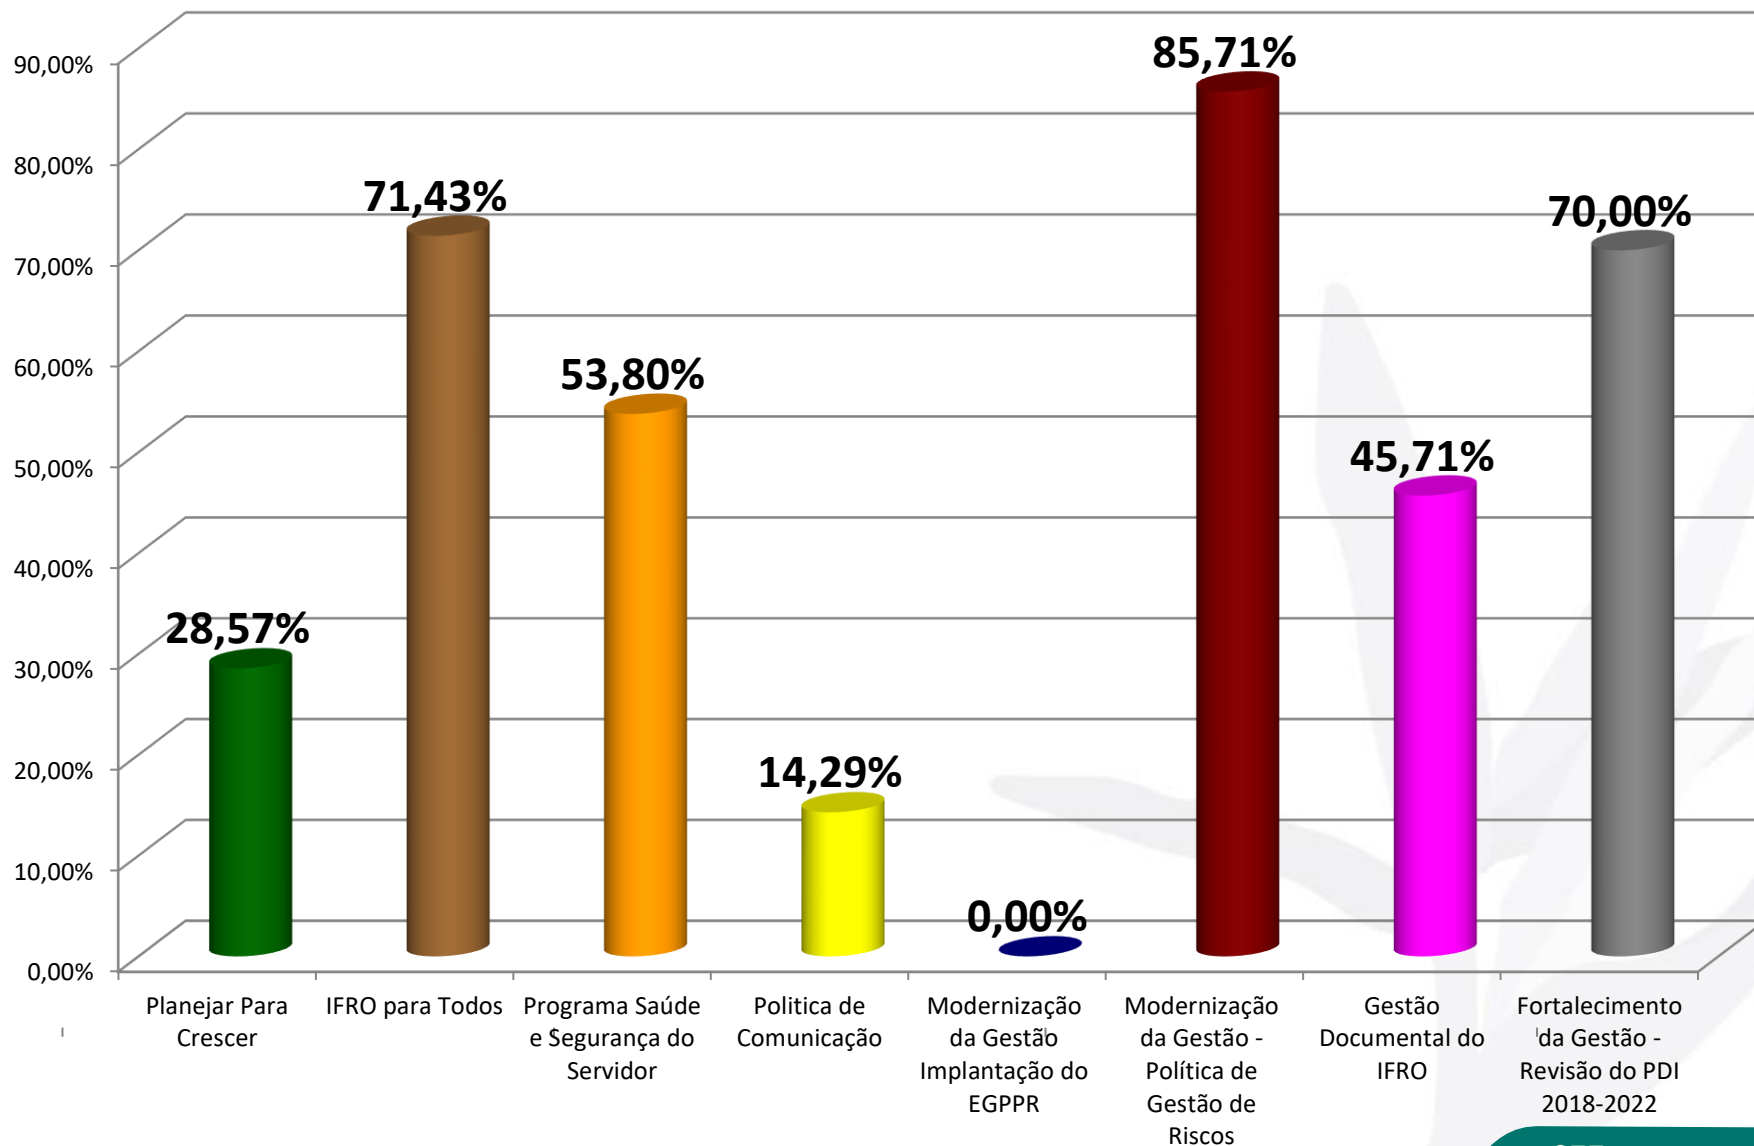

Percentual de Atraso

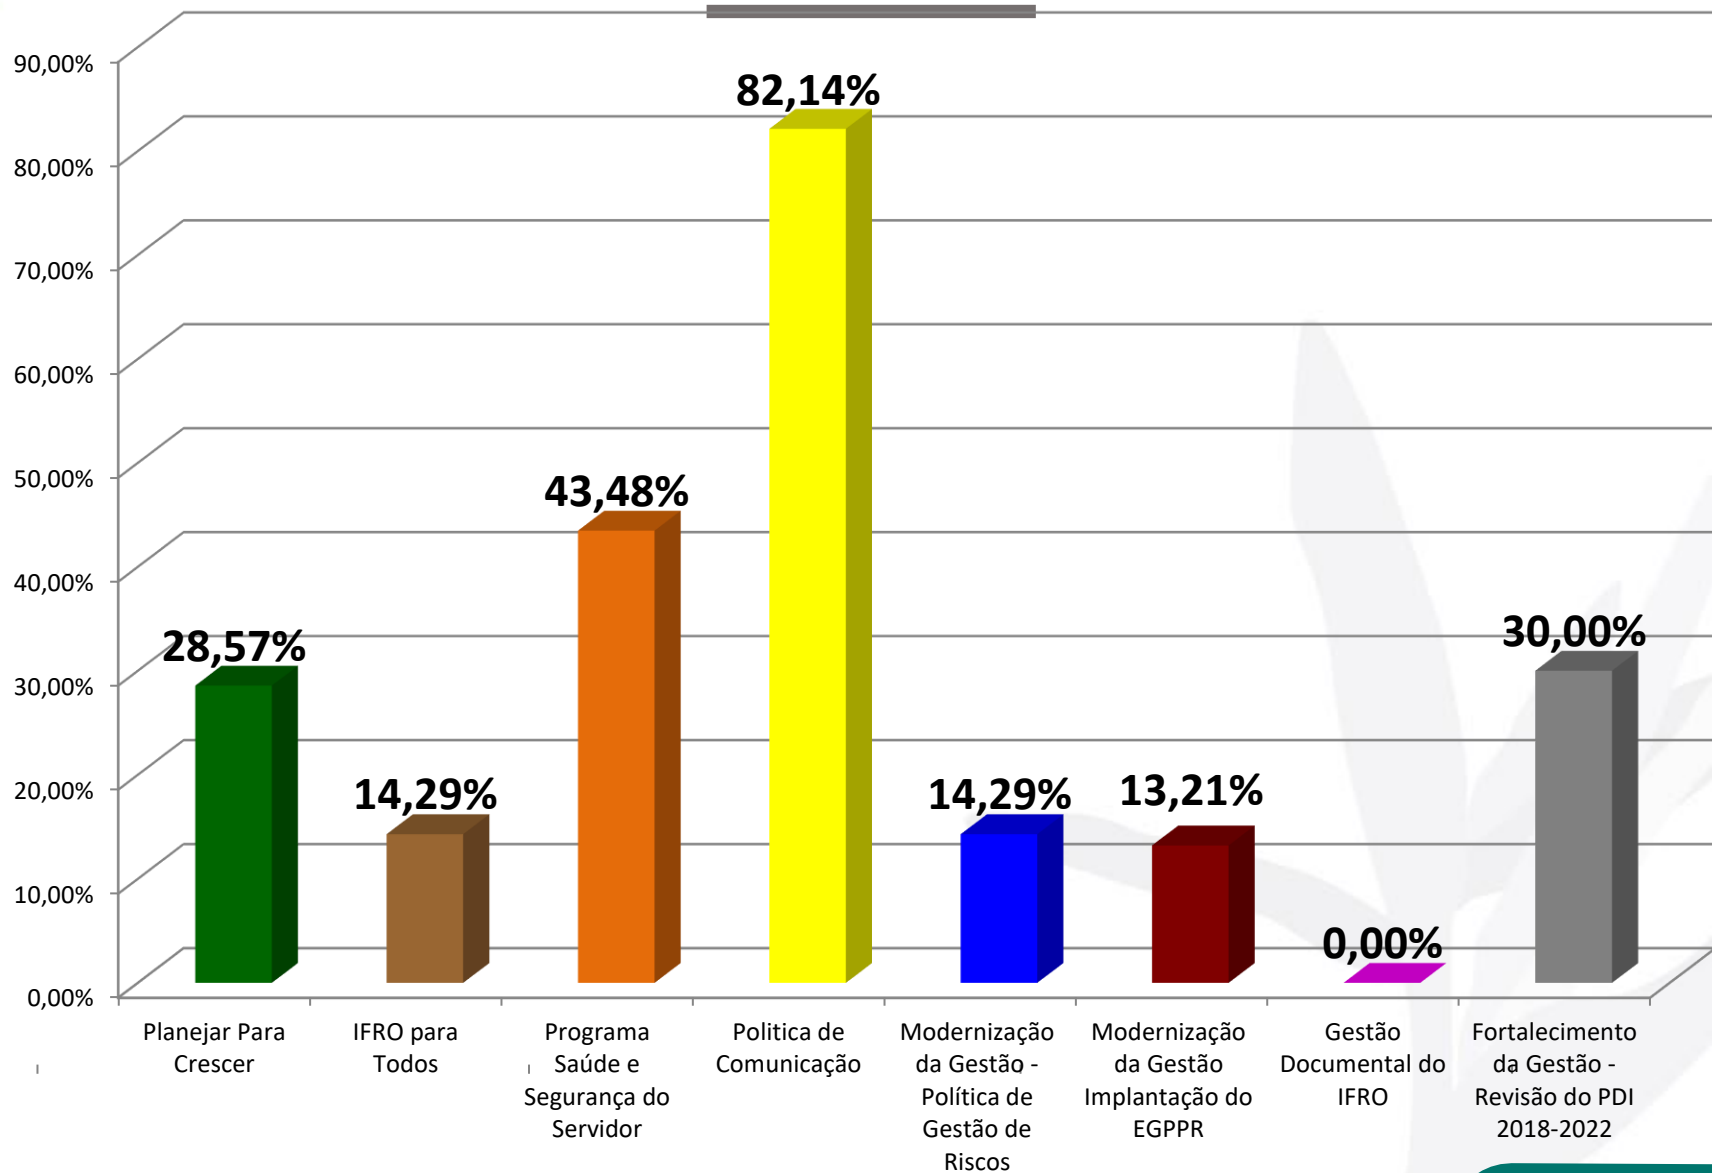


Objetivos Estratégico



Programa de Saúde e Segurança do Servidor – DGP

| | |
|------------------------------|--------------|
| Situação: | Em andamento |
| Início: | 01/05/2017 |
| Data prevista: | 30/07/2021 |
| Valor Previsto (R\$): | 451.412,00 |
| Valor Efetivo(R\$): | ? |

Programa de Saúde e Segurança do Servidor

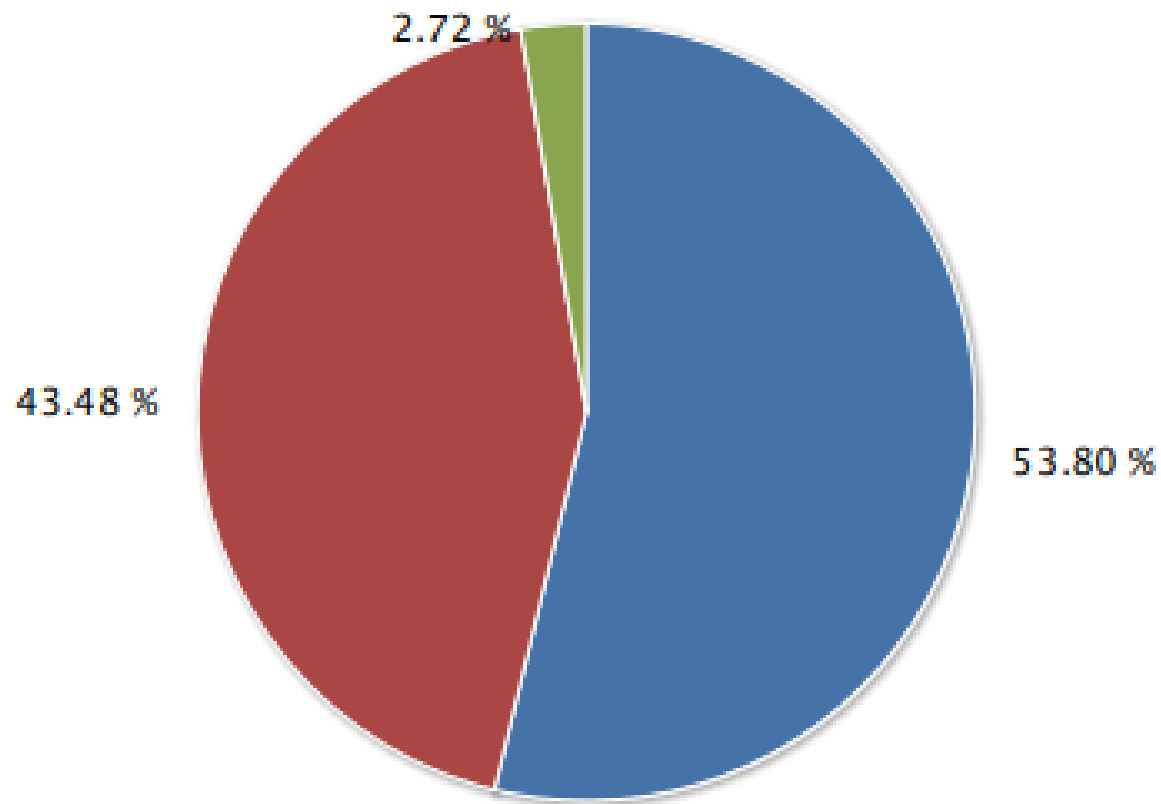

■ Entregue ■ Atrasada ■ A ser entregue


Objetivos Estratégico



Política de Comunicação do IFRO - ASCOM


| | |
|-----------------------|--------------|
| Situação: | Em andamento |
| Início: | 01/01/2019 |
| Data prevista: | 31/10/2020 |
| Valor Previsto (R\$): | 97.663,68 |
| Valor Efetivo(R\$): | 0,00 |

Política de Comunicação

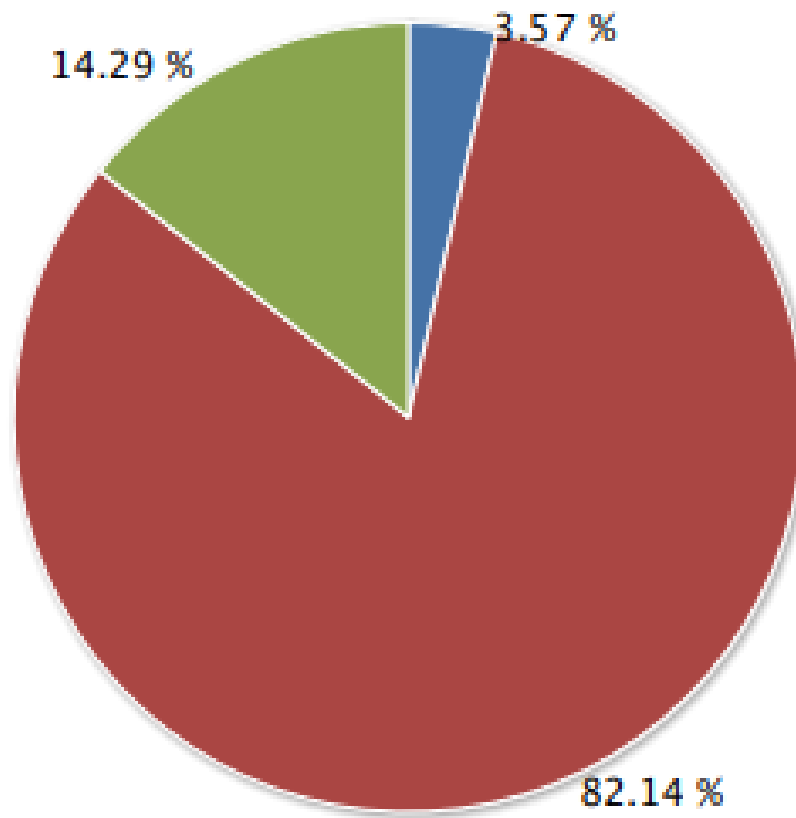

Entregue Atrasada A ser entregue

Análise




IFRO sem Fronteiras - ARINT

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Situação: | Solicitando Encerramento |
| Início: | 01/05/2018 |
| Data prevista: | 31/12/2019 |
| % Em execução | 0% |
| % Executado | 36,36 % |
| % Rejeitada | 63,64% |
| Valor Previsto (R\$): | 8.912,00 |
| Valor Efetivo(R\$): | ? |

IFRO sem Fronteiras

Situação das tarefas

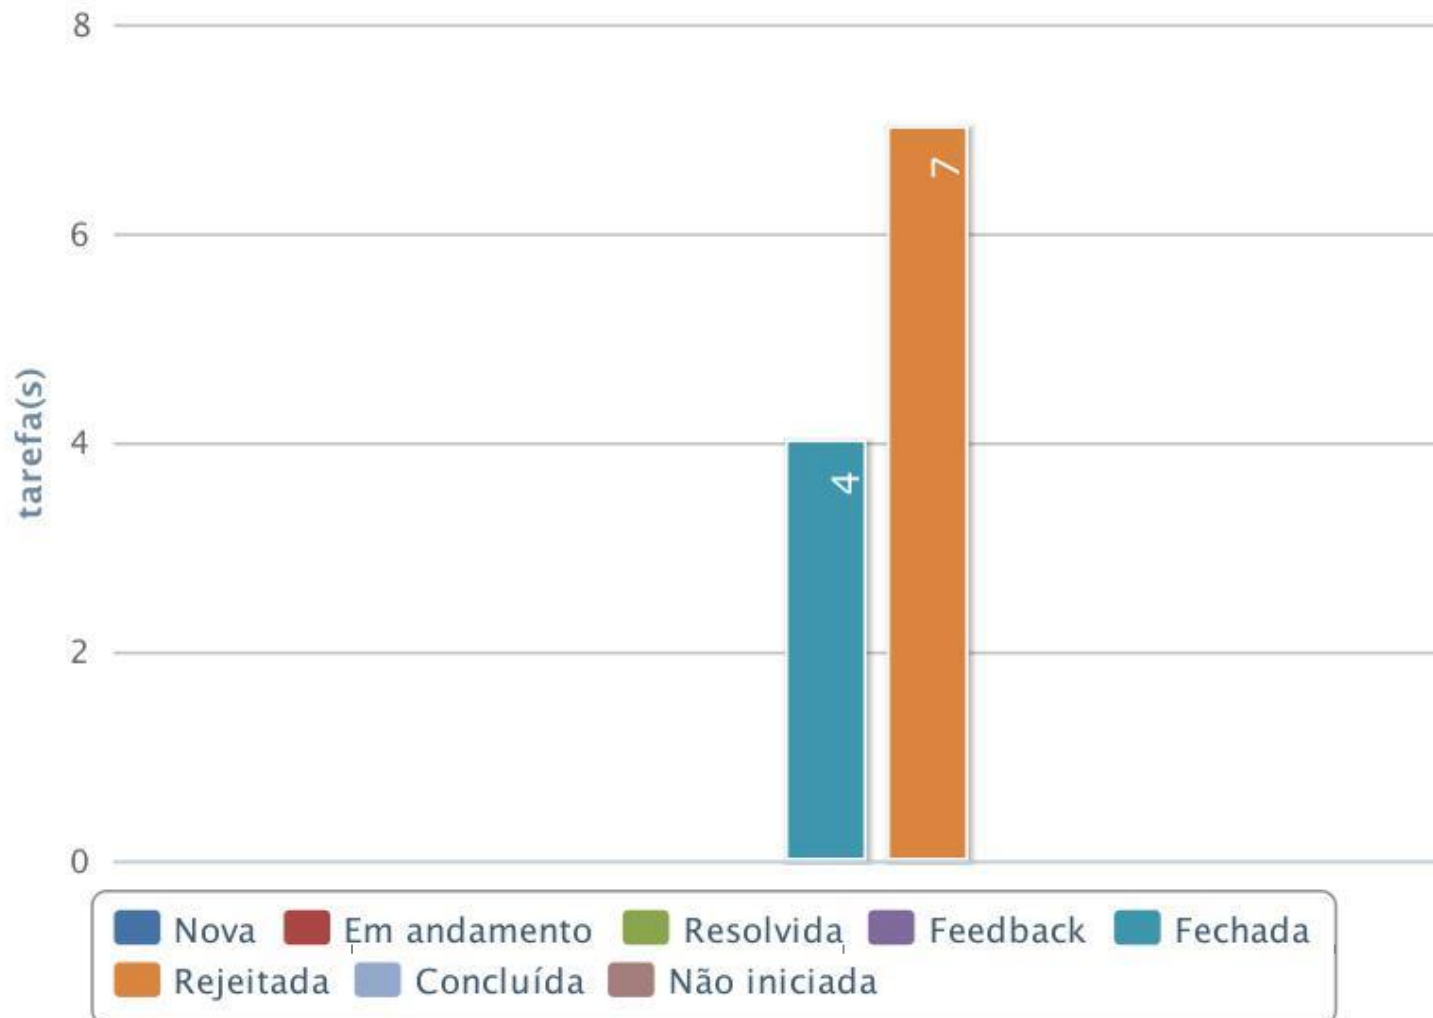

IFRO sem Fronteiras

IFRO SEM FRONTEIRAS

ETAPA 1 PLANEJAMENTO

Constituir grupo de trabalho para reformulação do Regulamento de Mobilidade Estudantil



Constituir grupo de trabalho para criação do Guia do aluno estrangeiro



Constituir grupo de trabalho para criação do Regulamento de Mobilidade Nacional e Internacional de Servidores



ETAPA 2 DESENVOLVIMENTO

Reformulação do Regulamento de Mobilidade Estudantil



Criação do Guia do aluno estrangeiro



Criação do Regulamento de Mobilidade Nacional e Internacional de Servidores



ETAPA 3 CAPACITAÇÃO


Ofertar capacitação em Projetos e metodologia de atendimento a alunos estrangeiros no IFRO



Ofertar capacitação em Cooperação Educacional na Fronteira



Análise




Fortalecimento dos NAPNEs


| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Situação: | Solicitando Encerramento |
| Início: | 05/2018 |
| Data prevista: | 08/2019 |
| % Em execução | 0% |
| % Executado | 100 % |
| Valor Previsto (R\$): | 8.295,76 |
| Valor Efetivo(R\$): | 8.295,76 |

Fortalecimento dos NAPNEs

Situação das tarefas

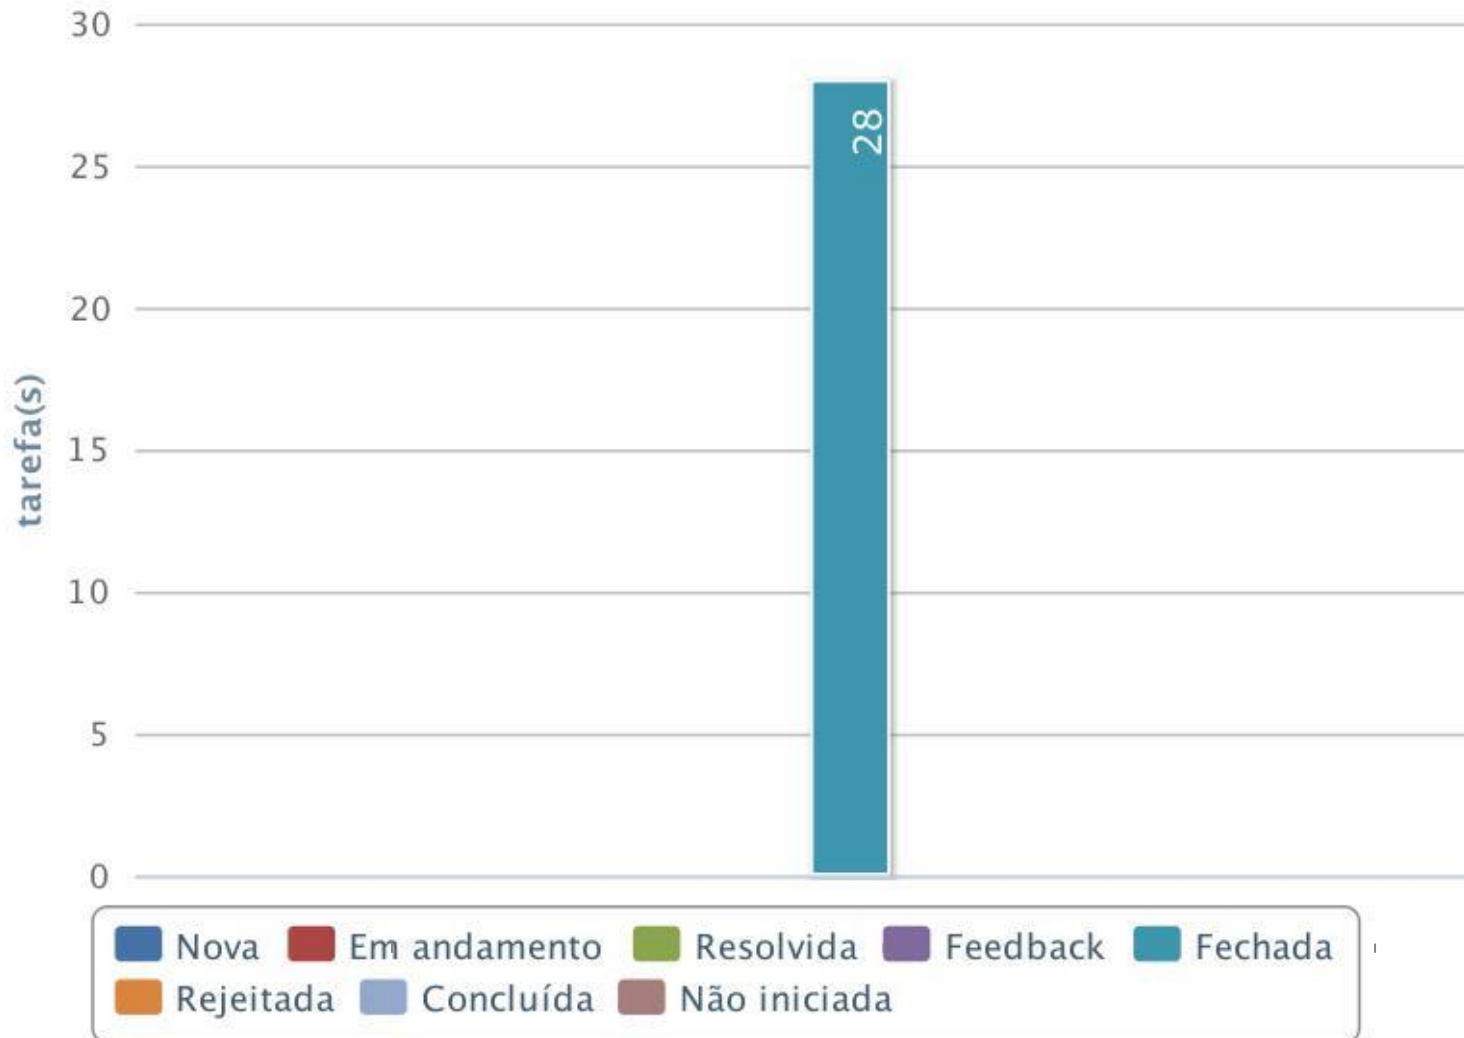

Fortalecimento dos NAPNEs

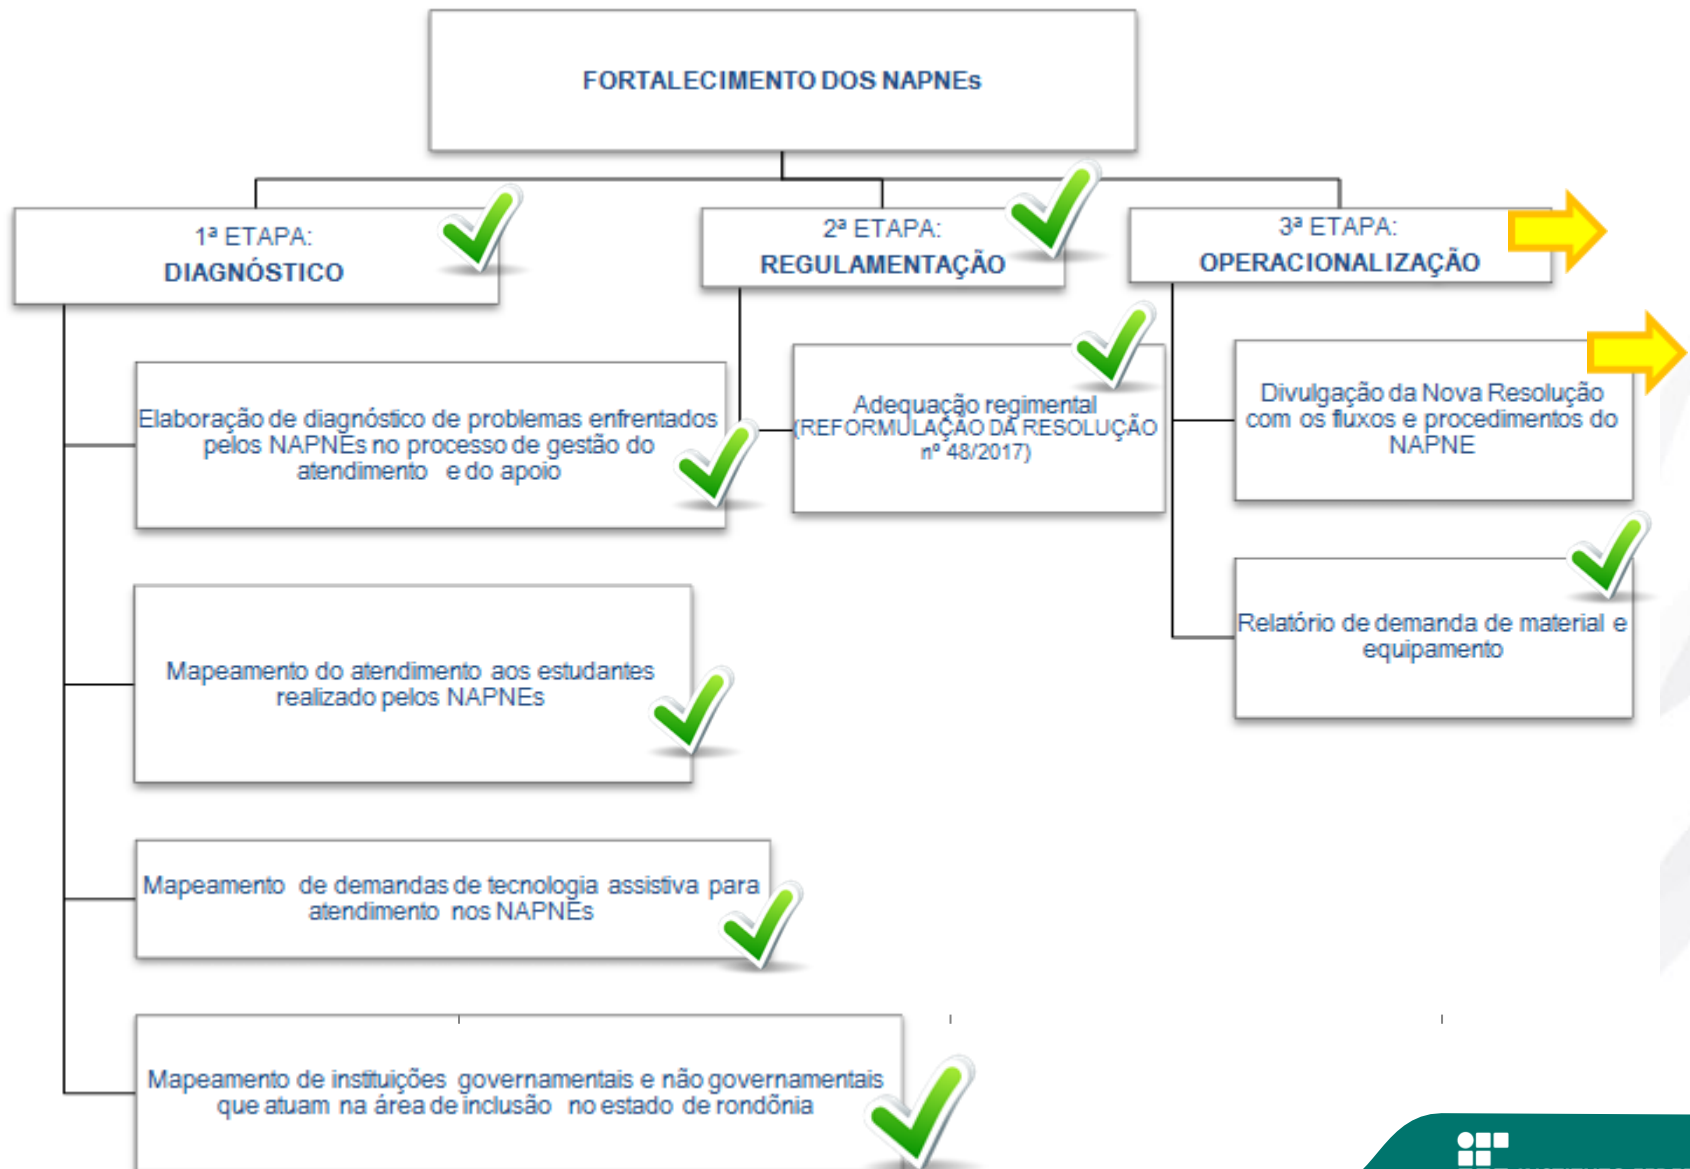



**INSTITUTO
FEDERAL**

Rondônia



**PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO**

DO IFRO

Muito Obrigada!

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

Diretoria de planejamento

prodin@ifro.edu.br / (69) 2182-9615

dplan@ifro.edu.br
